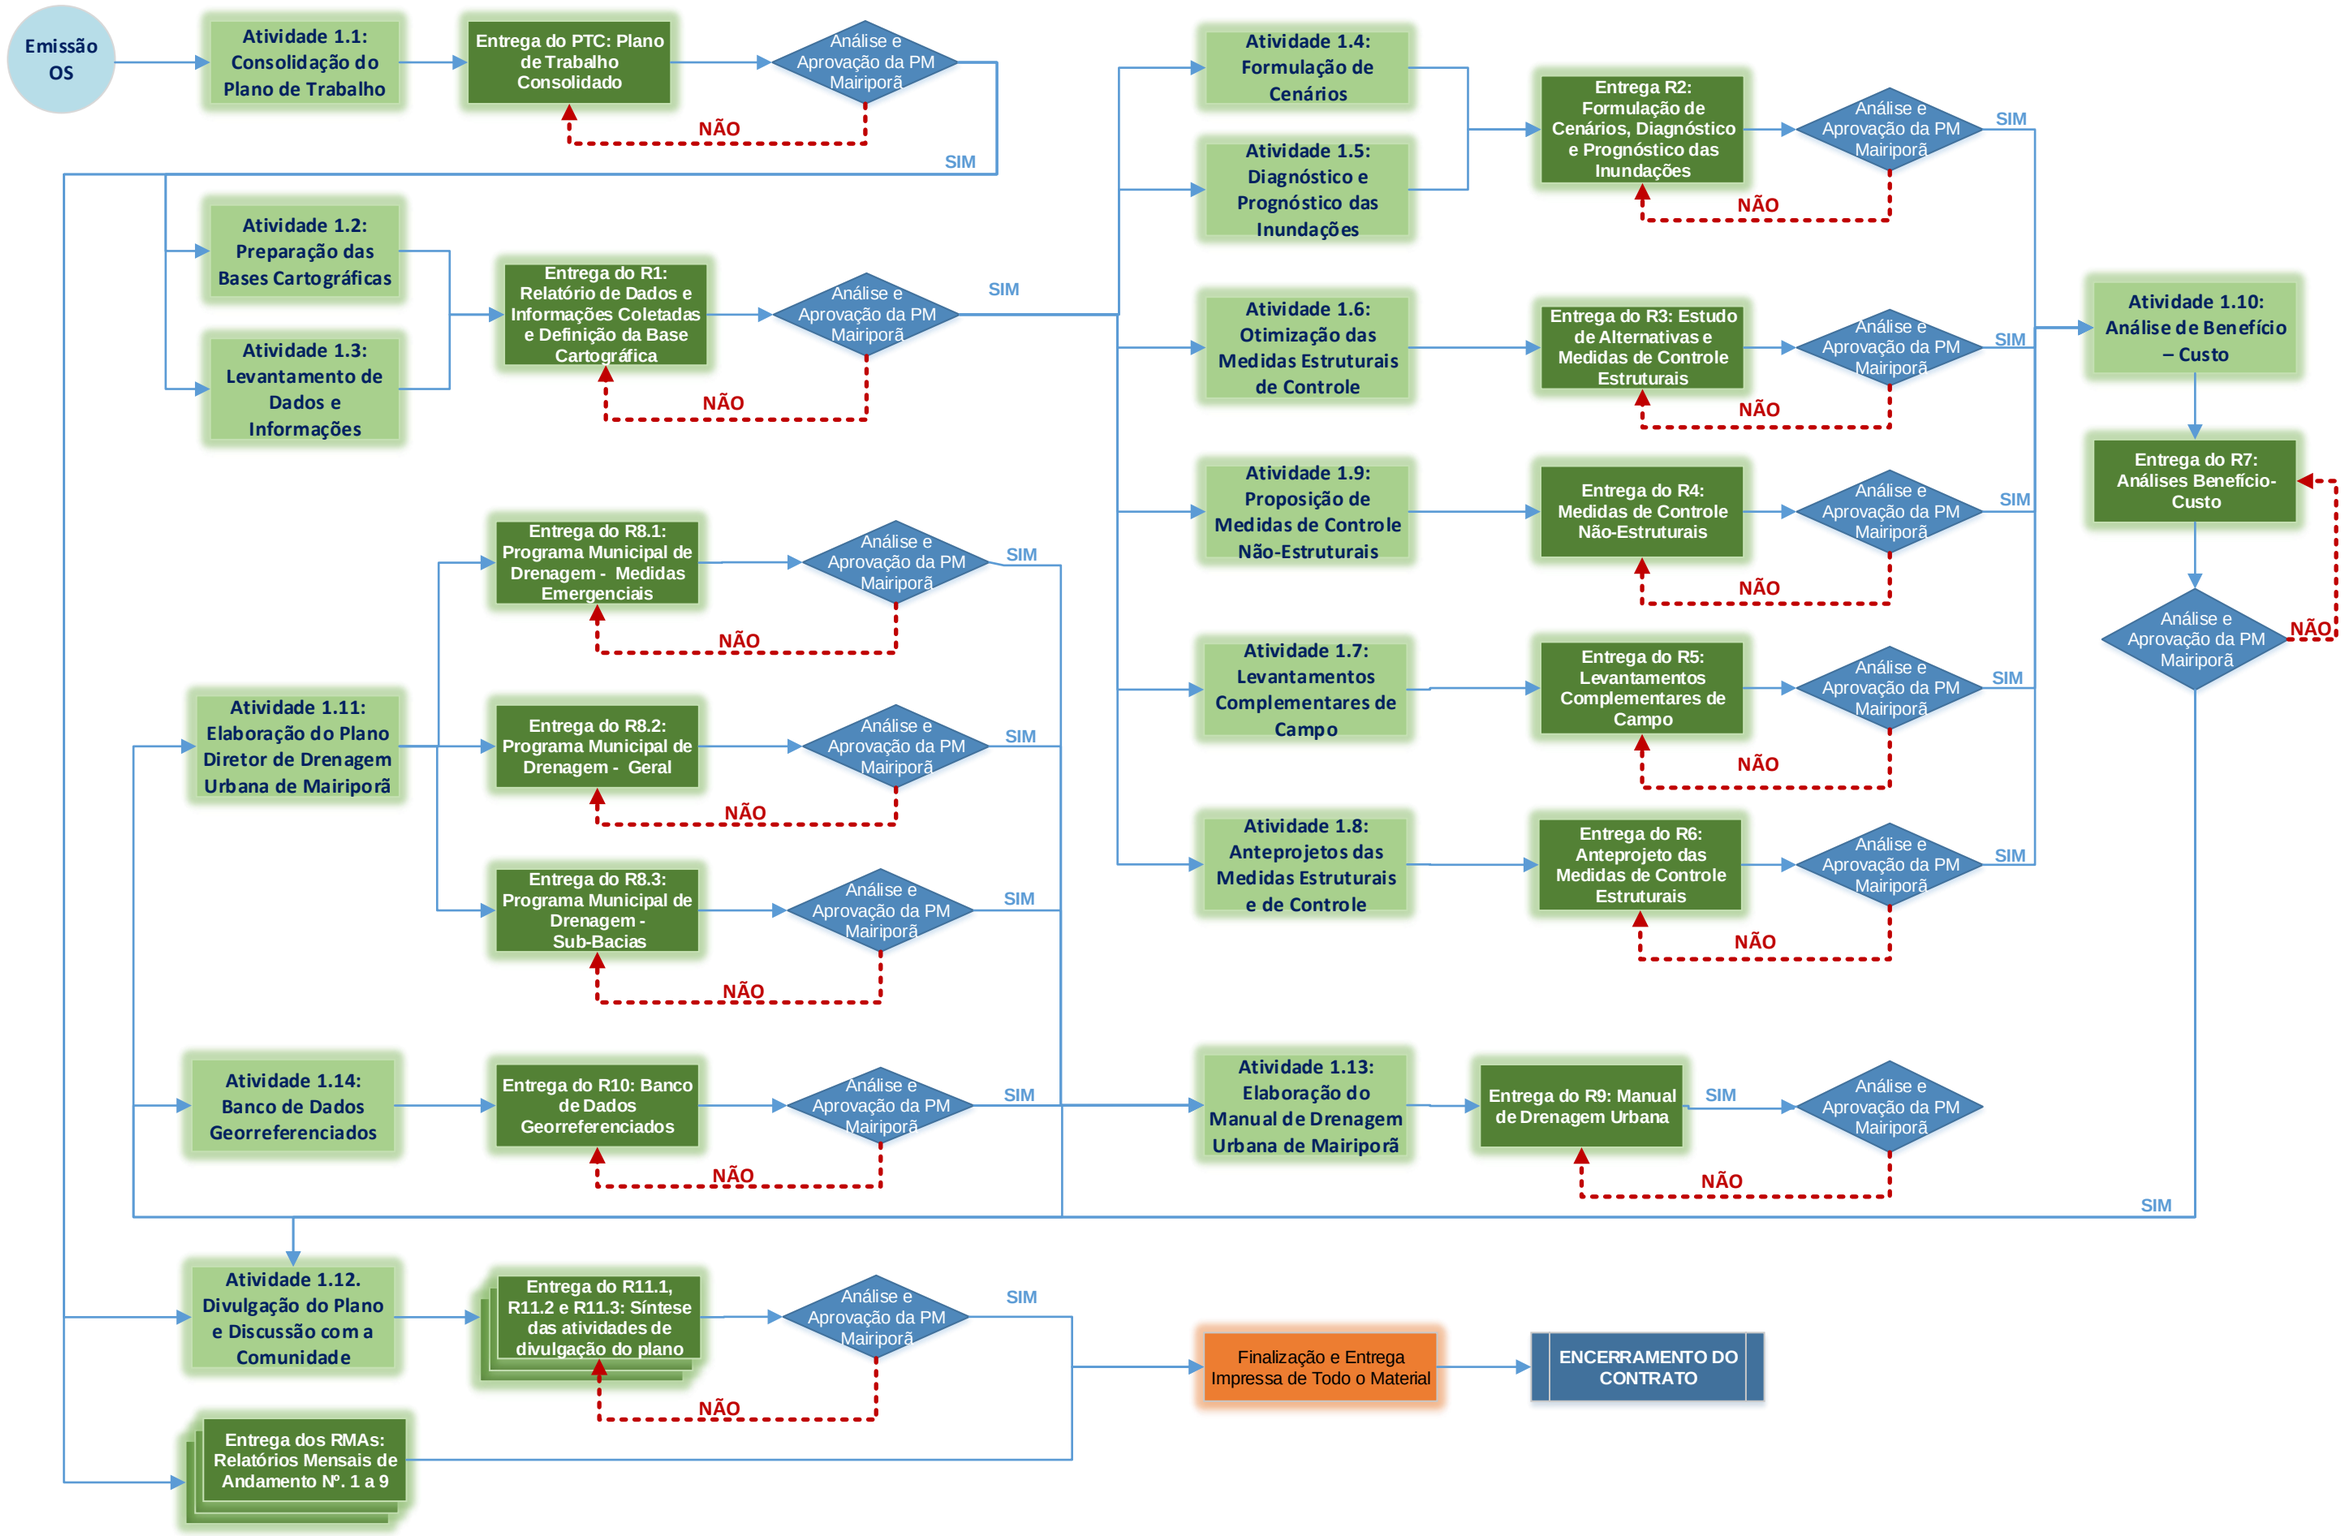
Emissão OS
Atividade 1.1: Consolidação do Plano de Trabalho
Entrega do PTC: Plano de Trabalho Consolidado
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.2: Preparação das Bases Cartográficas
Atividade 1.3: Levantamento de Dados e Informações
Entrega do R1: Relatório de Dados e Informações Coletadas e Definição da Base Cartográfica
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.4: Formulação de Cenários
Atividade 1.5: Diagnóstico e Prognóstico das Inundações
Entrega R2: Formulação de Cenários, Diagnóstico e Prognóstico das Inundações
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.6: Otimização das Medidas Estruturais de Controle
Entrega do R3: Estudo de Alternativas e Medidas de Controle Estruturais
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.9: Proposição de Medidas de Controle Não-Estruturais
Entrega do R4: Medidas de Controle Não-Estruturais
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.7: Levantamentos Complementares de Campo
Entrega do R5: Levantamentos Complementares de Campo
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.8: Anteprojetos das Medidas Estruturais e de Controle
Entrega do R6: Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.10: Análise de Benefício – Custo
Entrega do R7: Análises Benefício-Custo
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
Atividade 1.11: Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Mairiporã
Entrega do R8.1: Programa Municipal de Drenagem - Medidas Emergenciais
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Entrega do R8.2: Programa Municipal de Drenagem - Geral
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Entrega do R8.3: Programa Municipal de Drenagem - Sub-Bacias
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.14: Banco de Dados Georreferenciados
Entrega do R10: Banco de Dados Georreferenciados
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.13: Elaboração do Manual de Drenagem Urbana de Mairiporã
Entrega do R9: Manual de Drenagem Urbana
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Atividade 1.12. Divulgação do Plano e Discussão com a Comunidade
Entrega do R11.1, R11.2 e R11.3: Síntese das atividades de divulgação do plano
Análise e Aprovação da PM Mairiporã
NÃO
SIM
Entrega dos RMAs: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 1 a 9
Finalização e Entrega Impressa de Todo o Material
ENCERRAMENTO DO CONTRATO
